




CITTÀ DI VITERBO

Settore VII - Urbanistica e Centro Storico

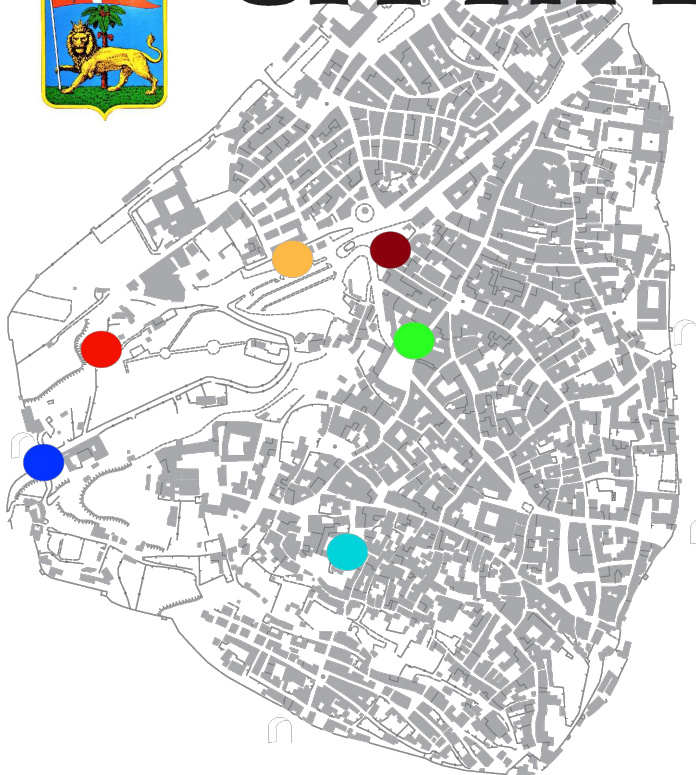

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1
Copia Documento

“Progetto di riqualificazione della casa del poeta Alfio per la realizzazione di un Check-point Turistico e restauro della Porta Faul”

nell'ambito della prima fase della Strategia Territoriale del PR FESR 2021-2027 - Obiettivo di Policy 5 (OP-5)

(CUP: D89E23000020002 - CIG: B582B8F555)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA

Riferimento Rev. 01	Elaborato A 11	Data 25/06/2025	Scala *****
PROGETTAZIONE		UFFICIO URBANISTICA E CENTRO STORICO	
Arch. Sergio Ferrante COLLABORATORI: Dott. Roberto Ferrante		Dirigente del Settore VII Architetto STEFANO PERUZZO Responsabile Unico del Progetto Architetto STEFANO PERUZZO	



Comune di Viterbo

Provincia di Viterbo

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point turistico della c.d. casa di Alfio

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

, 15/09/2025

Il Tecnico
(arch. Sergio Ferrante)



COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arriivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Gennaio 2026							Febbraio 2026							
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	Lavori a MISURA	178 g	267'291,39															
2	consolidamento	70 g	41'153,55															
3	murature	50 g	17'664,85															
4	restauro coperture	15 g	670,18															
5	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...	15 g	670,18															
6	restauro pavimentazioni e murature	45 g	11'282,90															
7	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... ato per metro cubo: ...	25 g	401,89															
8	TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETAL...	25 g	203,28															
9	CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE CON RETI IN G.F.R.P ... er dare l'op...	22 g	2'266,42															
10	Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro ... e ed ogni altro onere necessario: ...	30 g	916,41															
11	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... ato per metro cubo: ...	27 g	1'909,00															
12	Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannel ... un lato della parete. Con maglia 66...	10 g	1'160,64															
13	Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr ... re ordinarie: per uno strato a coprire eseguit...	5 g	1'704,84															
14	Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagio ... erifica la necessità di lavaggio ad acqua...	5 g	2'720,42															
15	sala porta faul	20 g	5'711,77															
16	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magiste...	20 g	2'255,39															
17	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per ottenere un prodotto finito seco...	20 g	584,06															
18	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e co ... l primo metro di lunghezza: muratura...	20 g	1'690,00															
19	Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non ... corre per dare il lavoro finito: per perf...	20 g	655,98															
20	Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, for ... re compreso quanto altro occo...	20 g	526,34															
21	copertura	26 g	20'731,65															
22	restauro coperture	26 g	19'019,58															
23	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... solo calo in basso: copp...	15 g	1'590,70															
24	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... eriale inutilizzabile: guain...	15 g	136,25															
25	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... solo calo in basso: tavolame in legno...	15 g	409,31															
26	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... vvisorio; escluso il solo calo in bas...	14 g	454,16															
27	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ... basso: per strutture sempl...	14 g	125,37															
28	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ... solo calo in basso: per strutt...	14 g	512,20															
29	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazi...	17 g	359,26															
30	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discari...	17 g	352,30															
31	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... si entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs ...	17 g	513,20															
32	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...	17 g	351,18															
33	Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o all ... ero: travi con quattro spigoli vivi ...	14 g	10'164,65															

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Gennaio 2026						Febbraio 2026								
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
34	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, ...	14 g	932,53															
35	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ffa. con materiale di recup...	19 g	2'636,24															
36	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ici articoli della tariffa. con tegol...	19 g	482,23															
37	sala porta faul	19 g	1'712,07															
38	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ... l'opera a perfetta regola d'arte: ...	19 g	1'423,22															
39	Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del moral...	19 g	136,44															
40	TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETAL...	19 g	33,63															
41	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ici articoli della tariffa. con tegol...	19 g	18,68															
42	Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ffa. con materiale di recup...	19 g	100,10															
43	opere edili di finitura	41 g	2'754,48															
44	restauro pavimentazioni e murature	41 g	2'754,48															
45	Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di ... nere e magistero per dare il lav...	40 g	1'325,28															
46	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad a...	38 g	1'429,20															
47	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il caric...	13 g	2,57															
48	impermeabilizzazione e coibentazione	67 g	30'848,58															
49	murature	32 g	533,23															
50	sala porta faul	32 g	533,23															
51	Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr ... colori tenui: per uno strato a coprire eseguit...	32 g	533,23															
52	copertura	22 g	30'234,49															
53	restauro coperture	22 g	30'234,49															
54	Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo ... ogni altro onere e magistero: delle dimensi...	18 g	5'798,97															
55	Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del moral...	18 g	1'485,68															
56	Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di ... , forniture accessorie ed ogni oner...	18 g	7'954,61															
57	Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ... mm più scaglie di ardesia del peso ...	19 g	2'900,38															
58	Compenso addizionale per applicazione a secco di uno stra ... ermeabilità all'acqua perpendicolare...	19 g	315,07															
59	PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORTO DI GR ... tre compr...	22 g	11'779,78															
60	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... solo calo in basso: copp...	7 g	60,52															
61	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... solo calo in basso: tavolame in legno di spessore ...	15 g	15,57															
62	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il caric...	15 g	4,77															
63	sicurezza	95 g	23'656,69															
64	sicurezza	95 g	23'656,69															
65	restauro coperture	95 g	23'299,39															
66	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei materiali per il pr...	55 g	11'145,89															

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Gennaio 2026 Febbraio 2026														
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
67	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te pere il mantenimento da...	55 g	6´631,56															
68	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minu ... tura ogni metro quadro di rete. Fornitur...	55 g	749,09															
69	Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici c ... e tiro in alto dei materiali, per il pr...	55 g	1´507,00															
70	Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici c ... nte per il mantenimento de...	55 g	1´224,00															
71	tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimens ... montaggio, smontaggio e ritiro ...	55 g	111,01															
72	tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimens ... ano di lavoro. Per ogni mese o frazi...	55 g	98,28															
73	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... montaggio, smontaggio e ritiro ...	55 g	184,80															
74	Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... ino a 2 metri. Per ogni mes...	55 g	104,16															
75	Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diamet ... schettoni a vite inclusi. Costo d'uso ...	55 g	8,56															
76	Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide ... a vite, 2 a doppia leva). Costo d'...	74 g	12,60															
77	Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ... pianto di terra e sei capicorda. Fornitur...	5 g	264,26															
78	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... osti. Montaggio, smontaggio e n...	95 g	256,30															
79	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o cinque posti. Nolo per ogni m...	95 g	33,60															
80	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... posti. Montaggio smontaggio e nolo pr...	95 g	70,20															
81	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... o cinque posti. Nolo per ogni m...	95 g	28,00															
82	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita d ... il montaggio e lo smontaggio e n...	95 g	115,20															
83	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita d ... e dei trasporti . nolo per ogni m...	95 g	102,72															
84	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle impres ... dal coordinatore. Costo medio procap...	5 g	206,31															
85	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensi...	95 g	0,65															
86	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensi...	95 g	2,20															
87	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... e. Nolo per ogni mese o frazio...	95 g	0,65															
88	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensi...	95 g	1,00															
89	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... e. Nolo per ogni mese o frazio...	95 g	0,80															
90	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.	5 g	46,38															
91	Kit di soccorso per il recupero verticale composto d...	75 g	69,60															
92	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v Nolo per ogni mese o frazione....	77 g	6,42															
93	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI ... e da polv...	5 g	41,93															
94	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a b ... lico denaturato a 70°...	5 g	13,50															
95	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levasc ... nox cm 11,5, due buste garza sterile...	5 g	28,55															
96	Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neut ... n pacco di fazzoletti di carta, ...	5 g	133,15															
97	Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticor ... 6 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per o...	77 g	98,22															
98	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. ... e. Nolo per ogni mese o frazio...	77 g	2,80															
99	tecnologie e arredi	95 g	357,30															

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Gennaio 2026						Febbraio 2026								
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
100	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... osti. Montaggio, smontaggio e n...	95 g	256,30															
101	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o cinque posti. Nolo per ogni m...	95 g	16,80															
102	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... posti. Montaggio smontaggio e nolo pr...	95 g	70,20															
103	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... o cinque posti. Nolo per ogni m...	95 g	14,00															
104	arredi e tecnologie	168 g	75´830,87															
105	opere edili di finitura	163 g	55´840,71															
106	restauro pavimentazioni e murature	80 g	33´411,59															
107	Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatol ... gni onere e magistero. in profilati normali fin...	16 g	379,55															
108	Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo "Blindo ... e sfridi, minimo da contabilizzare 1 ...	16 g	980,63															
109	Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e ... ra compreso ogni onere ed accessorio:...	32 g	1´945,93															
110	Copertura parapetto in legno di rovere con relativa intel ... ivestimento scala e parti ammalorate:...	32 g	8´540,00															
111	Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle ... e, compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatu...	32 g	1´058,29															
112	Protezione superficiale di materiale lapideo già consolid ... ne del prodotto previa accur...	30 g	6´695,02															
113	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: app ... lutare al mq, su tu...	30 g	10´204,24															
114	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... giatura. incluse le opere murarie ...	69 g	39,54															
115	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. ...	69 g	102,24															
116	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... elettrico monofase escluso...	69 g	80,56															
117	Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore ... zione della linea dorsale. pu...	69 g	30,99															
118	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custod ... entuali supporti, posta in opera a reg...	69 g	170,43															
119	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... ne nominale: FS17 450/750 V condotto...	69 g	518,40															
120	Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 24 -50/125 OM2	69 g	1´231,36															
121	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... di interruzione 4,5 kA 230-...	69 g	503,96															
122	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... i intervento AC - Sensibilita' 0,0...	69 g	410,58															
123	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per att ... e di ogni altro accessorio in opera: bipol...	69 g	81,84															
124	Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera Interruttore civile 1x10 A	69 g	17,56															
125	Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1)...	69 g	60,40															
126	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera	68 g	50,92															
127	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in ope...	29 g	144,78															
128	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in ope...	29 g	164,37															
129	tecnologie e arredi	143 g	22´429,12															
130	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ello spessore compresa tra 61 e 70...	20 g	1´365,00															
131	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" compost ... a e sfridi, minimo da contabilizzar...	106 g	215,67															
132	Opere di falegnameria per realizzazione di mobili conteni ... ello rialzato dal pavimento, pi...	106 g	9´900,00															

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Gennaio 2026						Febbraio 2026					
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06
133	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'ar...	44 g	461,25												
134	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, com ... er tracce di piccola sezione:...	44 g	387,20												
135	opere di falegnameria per mobili espositivi come da diseg ... lato, e tavolo riunione con armadie...	106 g	5'600,00												
136	opere di falegnameria per pannello decorativo come da disegno per retro banco rception	106 g	4'500,00												
137	collegamenti verticali	20 g	19'851,06												
138	tecnologie e arredi	20 g	19'851,06												
139	Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla ... escluse opere murarie: trazi...	19 g	19'288,42												
140	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...	20 g	91,06												
141	Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pie...	8 g	39,63												
142	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magiste...	13 g	160,04												
143	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per ottenere un prodotto finito seco...	13 g	41,44												
144	Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo ... ogni altro onere e magistero: delle dimensi...	13 g	130,08												
145	Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di ido ... ento da contabilizzare a parte: piastrelle...	20 g	16,01												
146	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: ... e: non armato con ausilio di marte...	20 g	3,43												
147	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazi...	20 g	11,85												
148	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discari...	20 g	34,09												
149	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...	20 g	35,01												
150	arredi e attrezzature	24 g	139,10												
151	restauro coperture	24 g	139,10												
152	PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Pannello de...	24 g	139,10												
153	pavimentazioni e sistemazioni stradali	85 g	28'531,90												
154	murature	40 g	2'496,74												
155	sala porta faul	40 g	2'496,74												
156	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peper...	40 g	653,09												
157	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... fino a 6 cm (Percentuale del 20%) peper...	40 g	518,02												
158	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... DR 13,6 (PN 20): diametro esterno ...	40 g	475,22												
159	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello spessore...	40 g	38,89												
160	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peper...	40 g	677,23												
161	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... fino a 6 cm (Percentuale del 20%) peper...	40 g	134,29												
162	opere edili di finitura	58 g	23'265,46												
163	restauro pavimentazioni e murature	58 g	23'265,46												
164	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peper...	45 g	6'358,39												
165	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... ino a 6 cm (Percentuale del 20%) travert...	45 g	6'680,24												


COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento


ID	Nome attivita'	Durata	Importo	Gennaio 2026 Febbraio 2026														
				26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09
166	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... mattoni industriali tipo "a mano" sabbi...	45 g	1'133,41															
167	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stuccature, stilatura, sigillatura dei giun...	45 g	2'401,48															
168	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... ino a 6 cm (Percentuale del 20%) travert...	45 g	1'911,06															
169	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale ... classe di resistenz...	24 g	1'738,96															
170	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondaz ... Classe di resistenz...	24 g	662,12															
171	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tond...	24 g	587,35															
172	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... ai controlli di legge; del tipo B ...	24 g	38,34															
173	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani ... mezzi meccanici, compreso il carico ...	24 g	670,48															
174	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, ... le ed esclusi gli eventuali oneri di discar...	24 g	63,96															
175	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...	24 g	1'019,67															
176	accesso pedonale laterale	52 g	2'769,70															
177	restauro pavimentazioni e murature	52 g	2'769,70															
178	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e ... orra per dare il lavoro compiut...	52 g	414,35															
179	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabi...	52 g	262,25															
180	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qua ... a discarica: cls armato non armato spess...	52 g	255,92															
181	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discari...	52 g	251,85															
182	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2...	52 g	258,59															
183	PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondaz ... Classe di resistenz...	52 g	204,59															
184	PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale ... classe di resistenz...	52 g	973,50															
185	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tond...	52 g	148,65															
186	overflow	172 g	67'269,80															
187	murature	30 g	50'636,76															
188	restauro pavimentazioni e murature	30 g	40'922,24															
189	Intonaco civile su murature con superfici che presentano ... Esclusi i ponteggi. con malta...	30 g	35'210,00															
190	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiat...	30 g	2'858,41															
191	Sovrapprezzo per l'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali (Percentuale del 10% di 77,85)	30 g	212,51															
192	Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq	30 g	2'641,32															
193	sala porta faul	30 g	9'714,52															
194	Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione ... azione della campionatura da pa...	30 g	9'714,52															
195	opere edili di finitura	168 g	15'417,81															
196	restauro pavimentazioni e murature	168 g	15'417,81															
197	Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pie...	30 g	3'606,37															
198	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazi...	18 g	117,19															

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - copia documento

COMUNE DI VITERBO
 Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

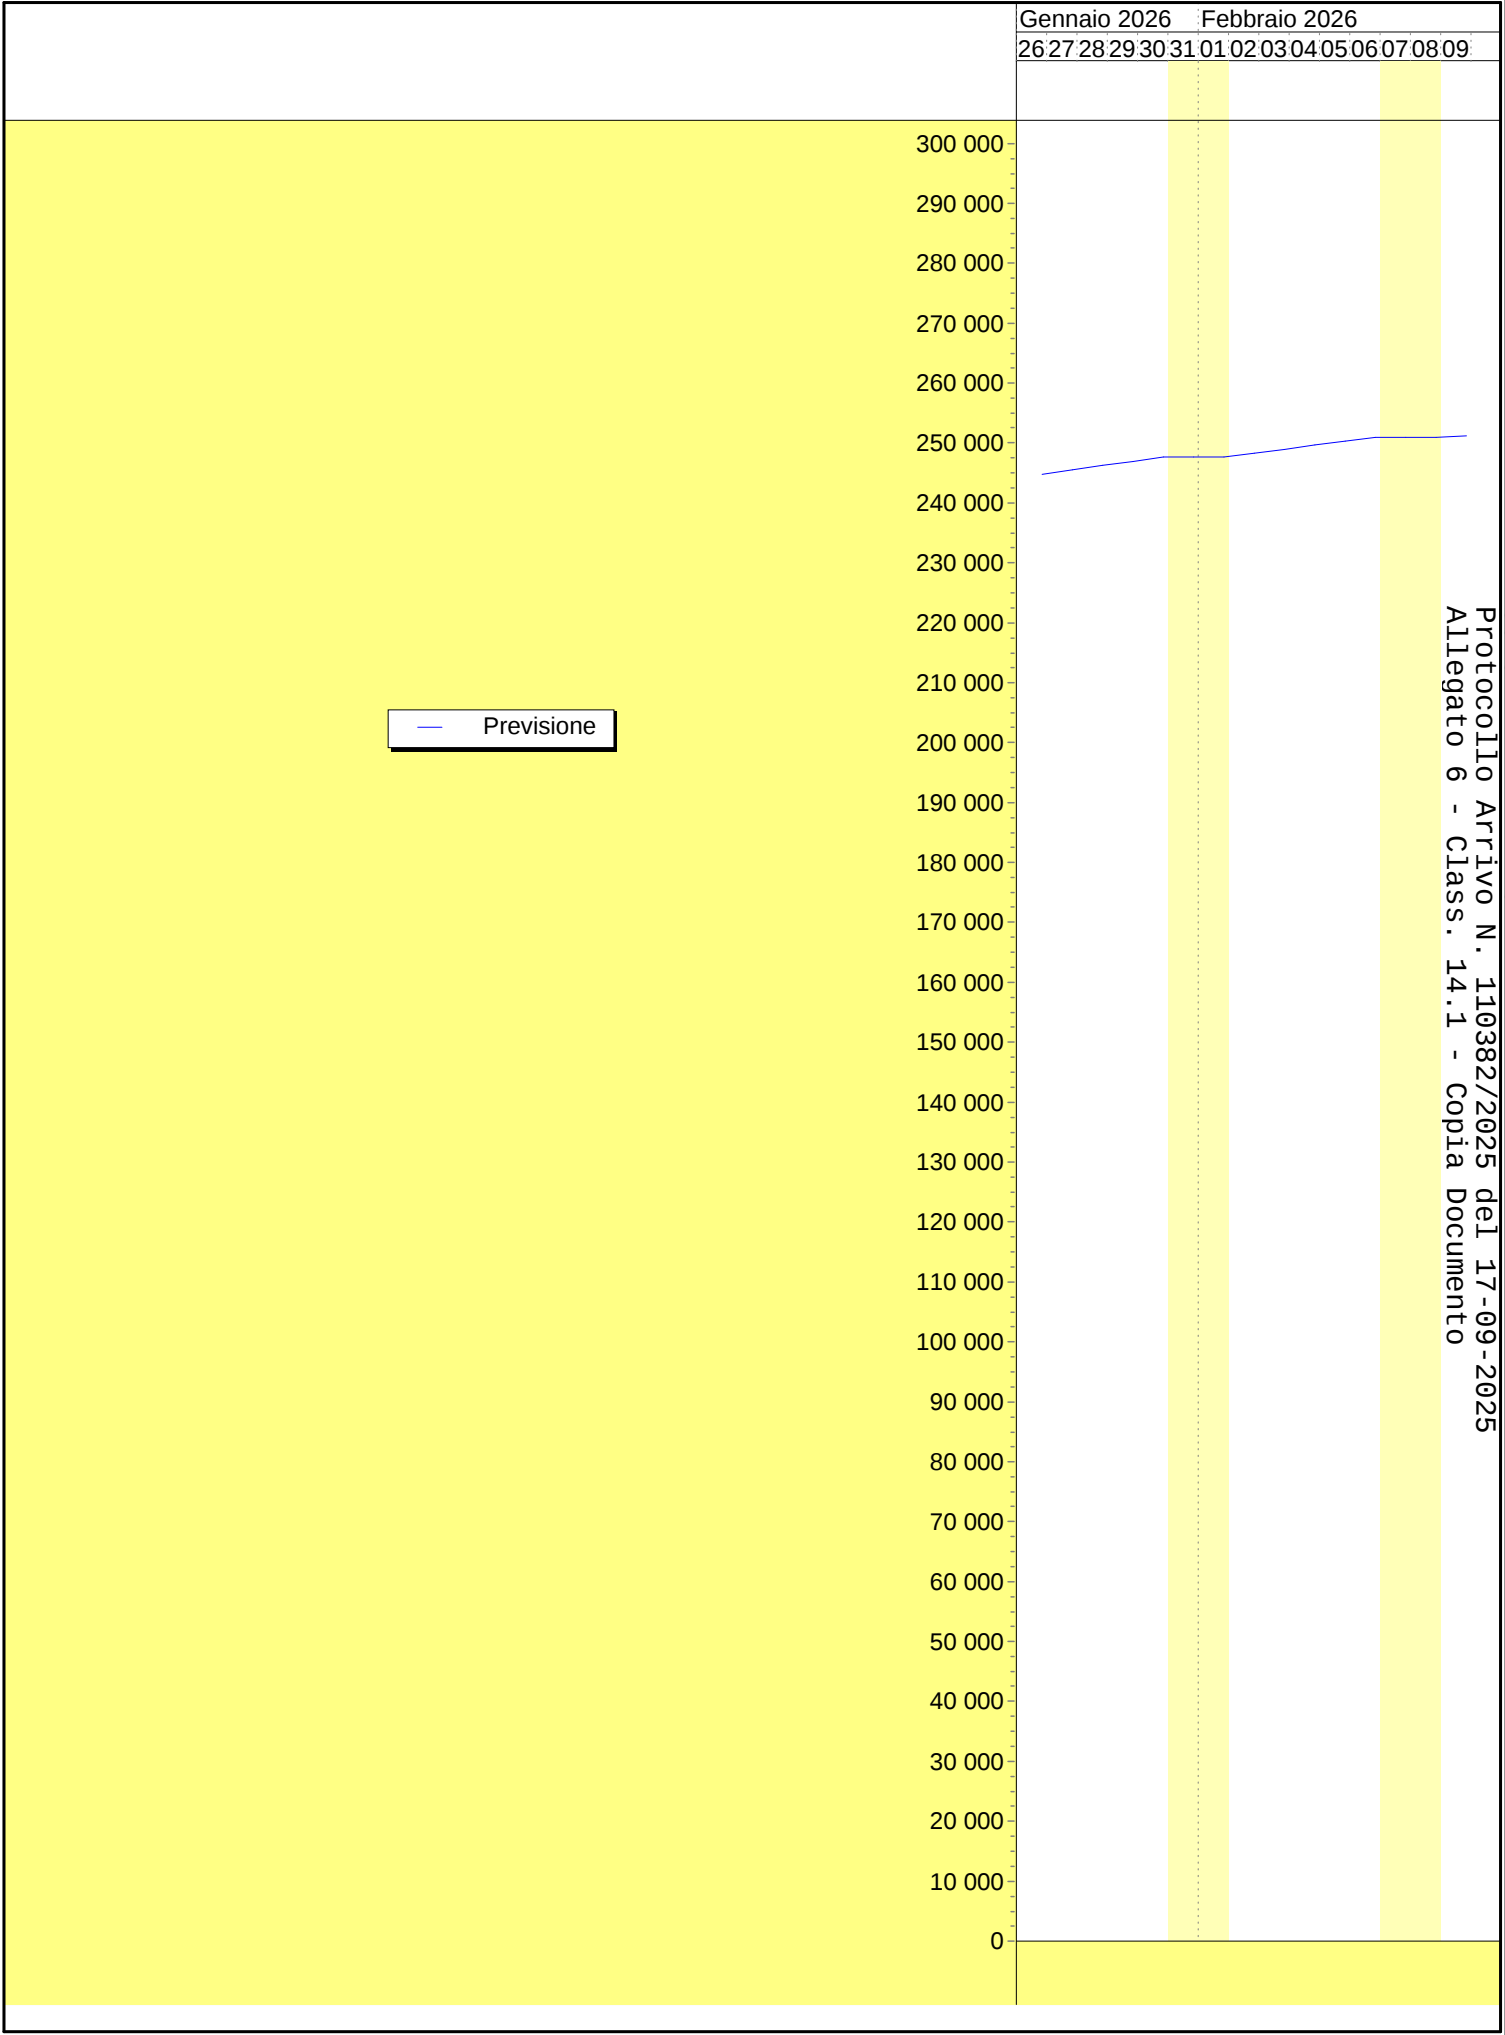

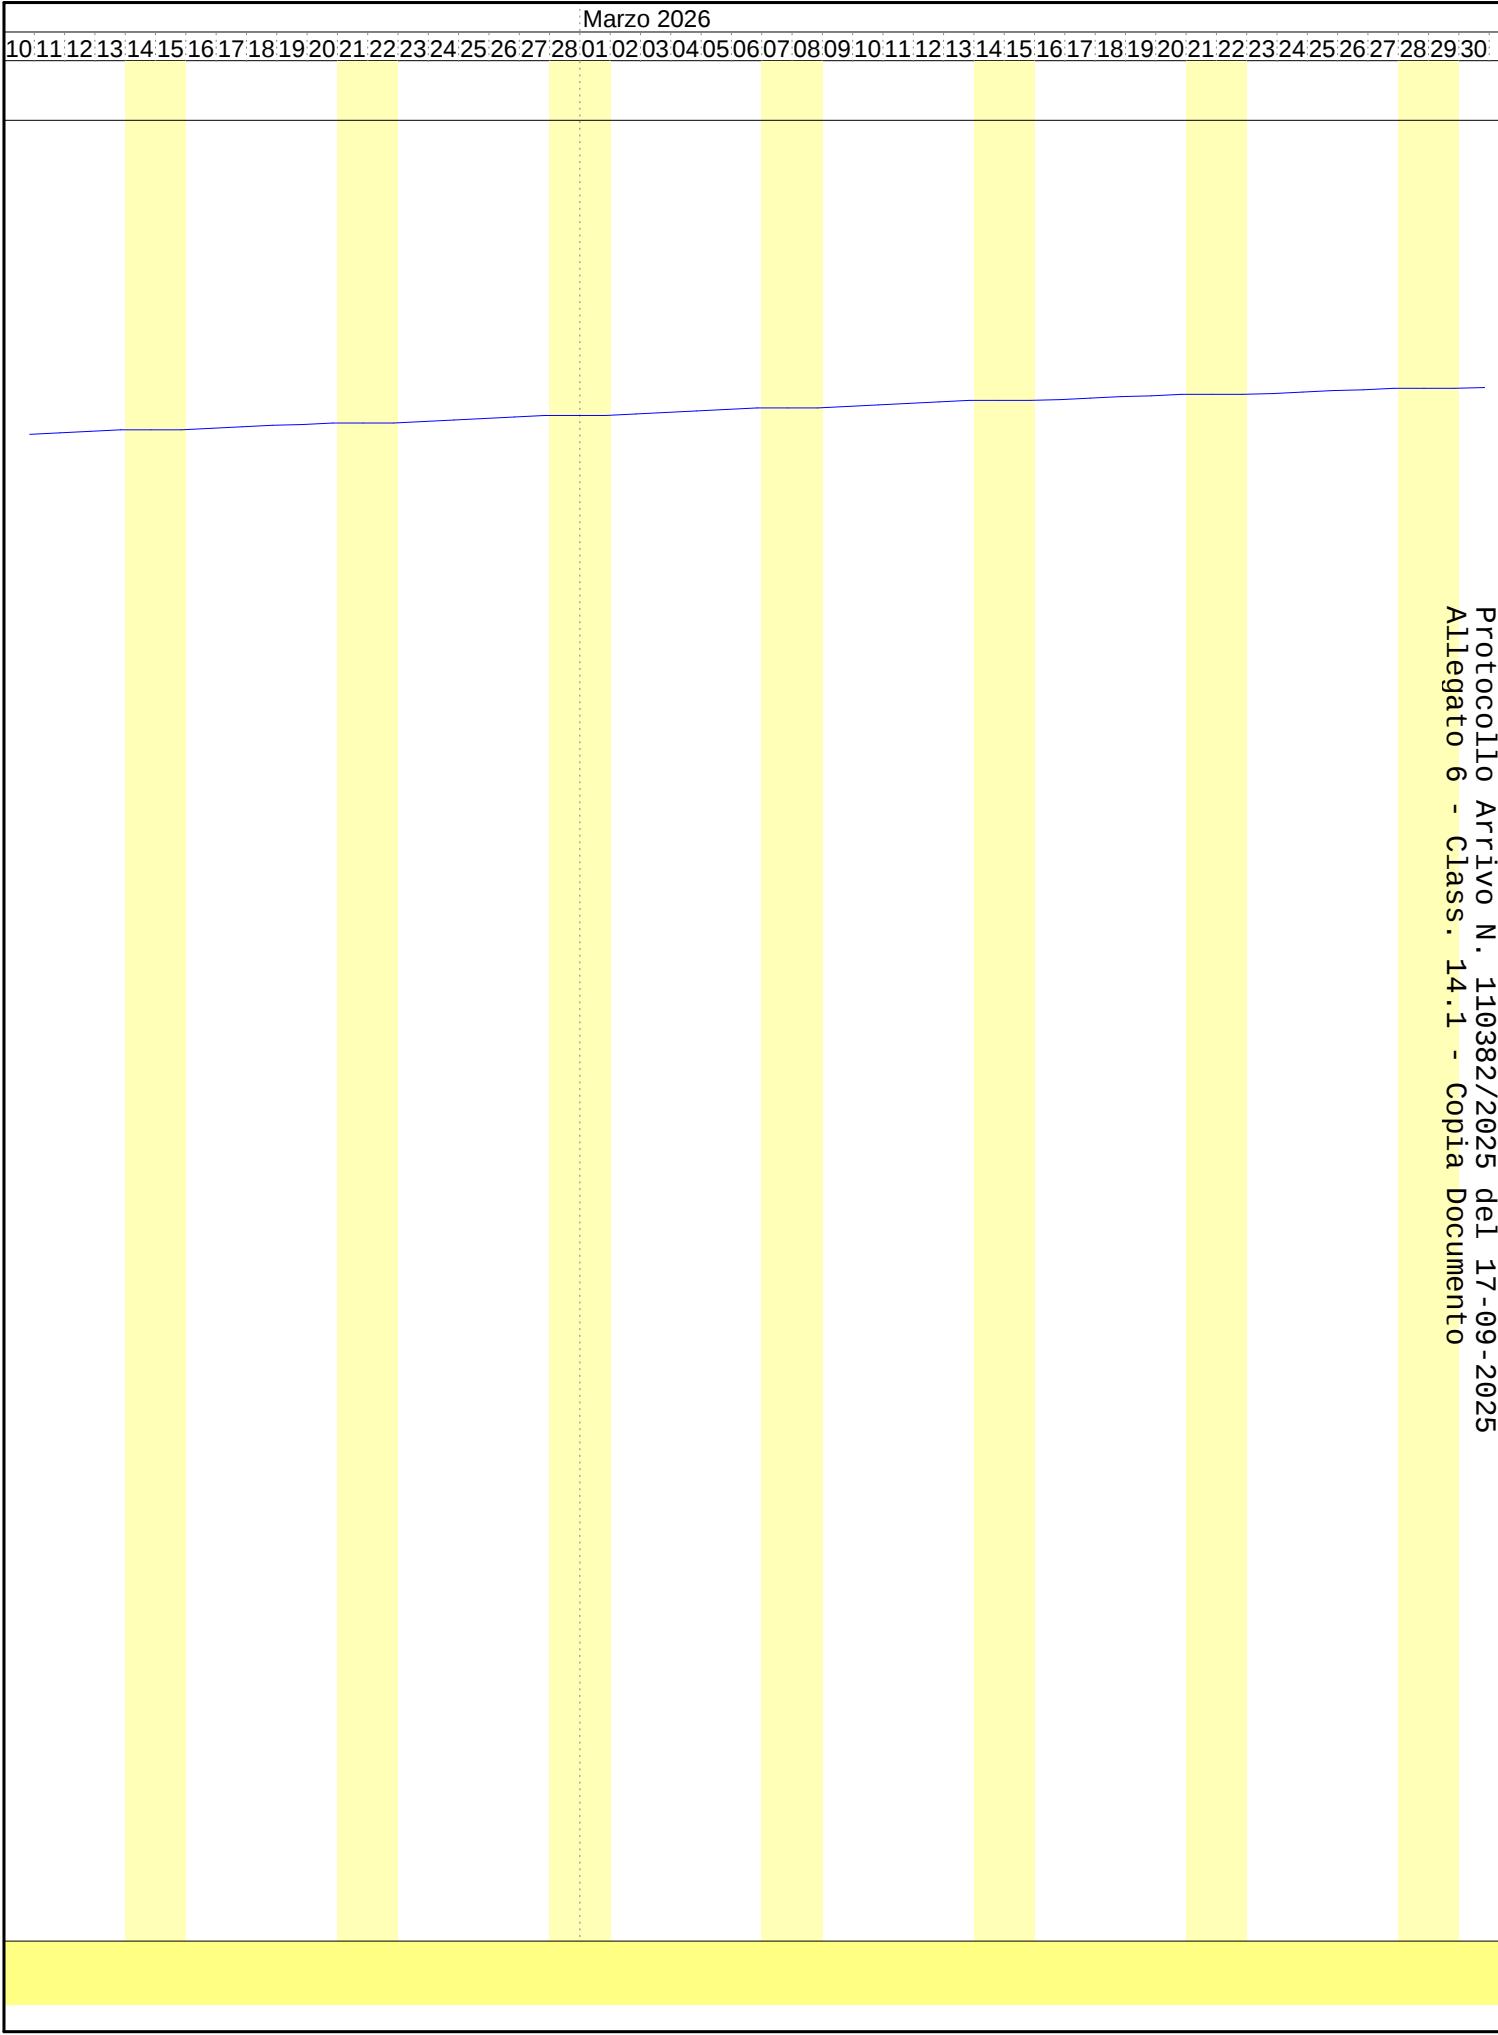

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

Aprile 2026																	Maggio 2026																															
31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Aprile 2026																	Maggio 2026																																
31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

Giugno 2026																															Luglio 2026																		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Giugno 2026																															Luglio 2026																		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025

Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																	
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																	
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																	
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																	
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																	
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																		
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Settembre 2026															Ottobre 2026																																	
25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento																																																

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Comune di Viterbo

Provincia di Viterbo

Tabella Attività

OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point turistico della c.d. casa di Alfio

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

, 15/09/2025

Il Tecnico
(arch. Sergio Ferrante)

COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	267'291,39	100,000	15/09/2025	29/05/2026	178	257
* consolidamento	41'153,55	15,397	22/09/2025	31/12/2025	70	101
** murature	17'664,85	6,609	22/09/2025	28/11/2025	50	68
*** restauro coperture	670,18	0,251	22/09/2025	10/10/2025	15	19
**** Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame	670,18	0,251	22/09/2025	10/10/2025	15	19
*** restauro pavimentazioni e murature	11'282,90	4,221	29/09/2025	28/11/2025	45	61
**** Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... ato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito	401,89	0,150	06/10/2025	07/11/2025	25	33
**** TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E CERA D'API PER INTERNO ED ESTERNO.	203,28	0,076	13/10/2025	14/11/2025	25	33
**** CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE CON RETI IN G.F.R.P ... er dare l'opera finita. Con maglia 99x99 mm, spessore 3 mm	2'266,42	0,848	29/09/2025	28/10/2025	22	33
**** Tiranti formati da trefoli di acciaio di idoneo diametro ... e ed ogni altro onere necessario: per tensioni fino a 30 t	916,41	0,343	06/10/2025	14/11/2025	30	33
**** Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... ato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito	1'909,00	0,714	09/10/2025	14/11/2025	27	33
**** Messa in sicurezza dal ribaltamento fuori piano di pannel ... un lato della parete. Con maglia 66x66 mm, spessore 3 mm.	1'160,64	0,434	17/11/2025	28/11/2025	10	33
**** Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr ... re ordinarie: per uno strato a coprire eseguito a pennello	1'704,84	0,638	24/11/2025	28/11/2025	5	33
**** Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagio ... erifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti.	2'720,42	1,018	24/11/2025	28/11/2025	5	33
*** sala porta faul	5'711,77	2,137	29/09/2025	24/10/2025	20	26
**** Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B	2'255,39	0,844	29/09/2025	24/10/2025	20	26
**** Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147	584,06	0,219	29/09/2025	24/10/2025	20	26
**** Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e co ... l primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni	1'690,00	0,632	29/09/2025	24/10/2025	20	26
**** Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non ... corre per dare il lavoro finito: per perfori fino a 35 mm	655,98	0,245	29/09/2025	24/10/2025	20	26
**** Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, for ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	526,34	0,197	29/09/2025	24/10/2025	20	26
** copertura	20'731,65	7,756	22/09/2025	27/10/2025	26	36
*** restauro coperture	19'019,58	7,116	22/09/2025	27/10/2025	26	36
**** Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo	1'590,70	0,595	22/09/2025	10/10/2025	15	19
**** Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ...						

COMUNE DI VITERBO
 PROTOCOLLO ARTEF. N. 710382/2025 del 14-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
eriale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato	136,25	0,051	22/09/2025	10/10/2025	15	19
* * * * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm	409,31	0,153	22/09/2025	10/10/2025	15	19
* * * * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... vvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli	454,16	0,170	25/09/2025	14/10/2025	14	20
* * * * Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ... basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	125,37	0,047	25/09/2025	14/10/2025	14	20
* * * * Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ... solo calo in basso: per strutture composte quali capriate.	512,20	0,192	25/09/2025	14/10/2025	14	20
* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.	359,26	0,134	22/09/2025	14/10/2025	17	23
* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	352,30	0,132	22/09/2025	14/10/2025	17	23
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... si entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 5	513,20	0,192	22/09/2025	14/10/2025	17	23
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	351,18	0,131	22/09/2025	14/10/2025	17	23
* * * * Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o all ... ero: travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato	10'164,65	3,803	01/10/2025	20/10/2025	14	23
* * * * TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON PENNELLO.	932,53	0,349	01/10/2025	20/10/2025	14	23
* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ffa. con materiale di recupero proveniente dalla rimozione	2'636,24	0,986	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ici articoli della tariffa. con tegole e coppi alla romana	482,23	0,180	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * sala porta faul	1'712,07	0,641	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * * Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ... l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni pieni comuni	1'423,22	0,532	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * * Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del morale o listello	136,44	0,051	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * * TRATTAMENTO PROTETTIVO OPACO PER LEGNO E COTTO A BASE DI OLI VEGETALI E CERA D'API PER INTERNO ED ESTERNO.	33,63	0,013	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ici articoli della tariffa. con tegole e coppi alla romana	18,68	0,007	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * * * Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... ffa. con materiale di recupero proveniente dalla rimozione	100,10	0,037	01/10/2025	27/10/2025	19	27
* * opere edili di finitura	2'754,48	1,031	31/10/2025	31/12/2025	41	62
* * * restauro pavimentazioni e murature	2'754,48	1,031	31/10/2025	31/12/2025	41	62
* * * * Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di ... nere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1'325,28	0,496	03/11/2025	31/12/2025	40	59
* * * * Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ...						

COMUNE DI VITERBO
 PROTOCOLLO ARRETRATO N° 110382/2025 del 27-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione	1'429,20	0,535	31/10/2025	24/12/2025	38	55
* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	2,57	0,001	01/10/2025	17/10/2025	13	17
* impermeabilizzazione e coibentazione	30'848,58	11,541	22/09/2025	24/12/2025	67	94
* * murature	533,23	0,199	10/11/2025	24/12/2025	32	45
* * * sala porta faul	533,23	0,199	10/11/2025	24/12/2025	32	45
* * * * Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Pr ... colori tenui: per uno strato a coprire eseguito a pennello	533,23	0,199	10/11/2025	24/12/2025	32	45
* * copertura	30'234,49	11,311	01/10/2025	30/10/2025	22	30
* * * restauro coperture	30'234,49	11,311	01/10/2025	30/10/2025	22	30
* * * * Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo ... ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm	5'798,97	2,170	01/10/2025	24/10/2025	18	24
* * * * Compenso per la formazione di palombello di gronda da eseguirsi sul terminale del morale o listello	1'485,68	0,556	01/10/2025	24/10/2025	18	24
* * * * Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di ... , forniture accessorie ed ogni onere e magistero: castagno	7'954,61	2,976	01/10/2025	24/10/2025	18	24
* * * * Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ... mm più scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq	2'900,38	1,085	06/10/2025	30/10/2025	19	24
* * * * Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato impermeabilità all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s	315,07	0,118	06/10/2025	30/10/2025	19	24
* * * * PANNELLI MODULARI IN LEGNO TIPO SANDWICH CON SPORCO DI GR ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	11'779,78	4,407	01/10/2025	30/10/2025	22	30
* * Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo	60,52	0,023	22/09/2025	30/09/2025	7	15
* * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm	15,57	0,006	22/09/2025	10/10/2025	15	15
* * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	4,77	0,002	22/09/2025	10/10/2025	15	15
* sicurezza	23'656,69	8,851	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * sicurezza	23'656,69	8,851	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * restauro coperture	23'299,39	8,717	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei materiali per il primo mese o frazione	11'145,89	4,170	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te pere il mantenimento dalla sicurezza delle opere finite	6'631,56	2,481	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minu ... tura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.	749,09	0,280	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici c ... e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione	1'507,00	0,564	15/09/2025	28/11/2025	55	75

COMUNE DI VITERBO

 PROTOCOLLO ARRIANO N. 410382/2025 del 17-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * * Ponteggio con sistema tubo-giunto in tubolari metallici c ... nte per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	1'224,00	0,458	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimens ... montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.	111,01	0,042	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimens ... ano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo	98,28	0,037	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.	184,80	0,069	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su bo ... ino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo	104,16	0,039	15/09/2025	28/11/2025	55	75
* * * * Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diamet ... schettoni a vite inclusi. Costo d'uso per mese o frazione	8,56	0,003	15/09/2025	28/11/2025	55	
* * * * Doppio cordino di posizionamento regolabile in poliammide ... a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione	12,60	0,005	15/09/2025	30/12/2025	74	
* * * * Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ... pianto di terra e sei capicorda. Fornitura e posa in opera	264,26	0,099	15/09/2025	19/09/2025	5	
* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... osti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	256,30	0,096	15/09/2025	30/01/2026	95	
* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	33,60	0,013	15/09/2025	30/01/2026	95	
* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione.	70,20	0,026	15/09/2025	30/01/2026	95	
* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... o cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	28,00	0,010	15/09/2025	30/01/2026	95	
* * * * Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita d ... il montaggio e lo smontaggio e nolo primo mese o frazione	115,20	0,043	15/09/2025	30/01/2026	95	
* * * * Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita d ... e dei trasporti . nolo per ogni mese successivo o frazione	102,72	0,038	15/09/2025	30/01/2026	95	
* * * * Riunione di coordinamento fra i responsabili delle impres ... dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione.	206,31	0,077	15/09/2025	19/09/2025	5	
* * * * Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 8 ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 115 x 160.	0,65	0,000	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/ ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.	2,20	0,001	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.	0,65	0,000	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lg ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250.	1,00	0,000	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185.	0,80	0,000	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.	46,38	0,017	15/09/2025	19/09/2025	5	5
* * * * Kit di soccorso per il recupero verticale composto da:						

COMUNE DI VITERBO
 PROTOCOLLO ART. 149 N. 810382/2025 del 17-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
- ... mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza fune m 20.	69,60	0,026	15/09/2025	31/12/2025	75	108
* * * * Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, v ... Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 1 classe 3 A 13 BC.	6,42	0,002	15/09/2025	05/01/2026	77	113
* * * * OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI ... e da polveri grossolane, con trattamento anti- appannamento	41,93	0,016	15/09/2025	19/09/2025	5	5
* * * * SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a b ... lico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore	13,50	0,005	15/09/2025	19/09/2025	5	5
* * * * Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levasc ... nox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura	28,55	0,011	15/09/2025	19/09/2025	5	5
* * * * Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neut ... n pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura	133,15	0,050	15/09/2025	19/09/2025	5	5
* * * * Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticor ... 6 x 50 x 17 h. Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione.	98,22	0,037	15/09/2025	05/01/2026	77	113
* * * * Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.	2,80	0,001	15/09/2025	05/01/2026	77	113
* * * tecnologie e arredi	357,30	0,134	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... osti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	256,30	0,096	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... o cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	16,80	0,006	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... posti. Montaggio smontaggio e nolo primo mese o frazione.	70,20	0,026	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* * * * Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... o cinque posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	14,00	0,005	15/09/2025	30/01/2026	95	138
* arredi e tecnologie	75'830,87	28,370	29/09/2025	29/05/2026	168	443
* * opere edili di finitura	55'840,71	20,891	06/10/2025	29/05/2026	163	239
* * * restauro pavimentazioni e murature	33'411,59	12,500	06/10/2025	30/01/2026	80	117
* * * * Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatol ... gni onere e magistero. in profilati normali fino a 2,00 mq	379,55	0,142	20/10/2025	10/11/2025	16	22
* * * * Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo "Blindo ... e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 18/19 mm	980,63	0,367	20/10/2025	10/11/2025	16	22
* * * * Soglia interna in legno della larghezza di circa 120 mm e ... ra compreso ogni onere ed accessorio: in castagno o rovere	1'945,93	0,728	10/11/2025	24/12/2025	32	45
* * * * Copertura parapetto in legno di rovere con relativa intel ... investimento scala e parti ammalorate: in castagno o rovere	8'540,00	3,195	10/11/2025	24/12/2025	32	45
* * * * Pavimento in listoni di legno prima scelta, conforme alle ... e, compresi tagli, sfridi, lamatura e laccatura: di Rovere	1'058,29	0,396	10/11/2025	24/12/2025	32	45
* * * * Protezione superficiale di materiale lapideo già consolid ... ne del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli.	6'695,02	2,505	06/10/2025	14/11/2025	30	40
* * * * Ristabilimento della coesione mediante impregnazione: app ... lutare al mq, su tufo, arenarie, calcari teneri e laterizi	10'204,24	3,818	06/10/2025	14/11/2025	30	40

COMUNE DI VITERBO
 Protocollo Art. 138
 Allegato 6
 Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * * Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... giatura. incluse le opere murarie con conduttori tipo FS17	39,54	0,015	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T	102,24	0,038	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio	80,56	0,030	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore ... zione della linea dorsale. punto presa in tubazione in pvc	30,99	0,012	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custod ... entuali supporti, posta in opera a regola d'arte: 3P+T 63A	170,43	0,064	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... ne nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 10 mm ²	518,40	0,194	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 24 -50/125 OM2	1'231,36	0,461	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... di interruzione 4,5 kA 230-400 V: quadripolare fino a 32 A	503,96	0,189	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... i intervento AC - Sensibilita' 0,03 A bipolare fino a 63 A	410,58	0,154	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per att ... e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a 125 A	81,84	0,031	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V , in opera Interruttore civile 1x10 A	17,56	0,007	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado d ... l. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x10A+T	60,40	0,023	21/10/2025	30/01/2026	69	102
* * * * Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera	50,92	0,019	21/10/2025	29/01/2026	68	102
* * * * Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20	144,78	0,054	21/10/2025	28/11/2025	29	102
* * * * Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm	164,37	0,061	21/10/2025	28/11/2025	29	102
* * * tecnologie e arredi	22'429,12	8,391	03/11/2025	29/05/2026	143	208
* * * * Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ello spessore compresa tra 61 e 70 mm in castagno o rovere	1'365,00	0,511	03/11/2025	28/11/2025	20	26
* * * * Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" compost ... a e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 8/9 mm	215,67	0,081	29/12/2025	29/05/2026	106	152
* * * * Opere di falegnameria per realizzazione di mobili conteni ... ello rialzato dal pavimento, piano superiore spessore 3 cm	9'900,00	3,704	29/12/2025	29/05/2026	106	152
* * * * Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e	461,25	0,173	03/11/2025	08/01/2026	44	67
* * * * Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, com ... er tracce di piccola sezione: in muratura di mattoni pieni	387,20	0,145	03/11/2025	08/01/2026	44	67
* * * * opere di falegnameria per mobili espositivi come da diseg ...						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
lato, e tavolo riunione con armadietti integrati alla base	5'600,00	2,095	29/12/2025	29/05/2026	106	152
* * * * opere di falegnameria per pannello decorativo come da disegno per retro banco reception	4'500,00	1,684	29/12/2025	29/05/2026	106	152
* * collegamenti verticali	19'851,06	7,427	03/10/2025	30/10/2025	20	28
* * * tecnologie e arredi	19'851,06	7,427	03/10/2025	30/10/2025	20	28
* * * * Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla ... escluse opere murarie: trazione elettrica: portata 100 kg	19'288,42	7,216	06/10/2025	30/10/2025	19	25
* * * * Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame	91,06	0,034	03/10/2025	30/10/2025	20	28
* * * * Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pietra squadrata regolare.	39,63	0,015	21/10/2025	30/10/2025	8	
* * * * Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B	160,04	0,060	14/10/2025	30/10/2025	13	
* * * * Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147	41,44	0,016	14/10/2025	30/10/2025	13	
* * * * Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo ... ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm	130,08	0,049	14/10/2025	30/10/2025	13	
* * * * Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di ido ... ento da contabilizzare a parte: piastrelle in grès o cotto	16,01	0,006	03/10/2025	30/10/2025	20	
* * * * Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: ... e: non armato con ausilio di martello demolitore meccanico	3,43	0,001	03/10/2025	30/10/2025	20	
* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.	11,85	0,004	03/10/2025	30/10/2025	20	
* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	34,09	0,013	03/10/2025	30/10/2025	20	
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	35,01	0,013	03/10/2025	30/10/2025	20	
* * arredi e attrezzature	139,10	0,052	29/09/2025	30/10/2025	24	32
* * * restauro coperture	139,10	0,052	29/09/2025	30/10/2025	24	32
* * * * PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Pannello dello spessore nominale di 25 mm	139,10	0,052	29/09/2025	30/10/2025	24	32
* pavimentazioni e sistemazioni stradali	28'531,90	10,674	12/11/2025	17/03/2026	85	126
* * murature	2'496,74	0,934	24/11/2025	23/01/2026	40	61
* * * sala porta faul	2'496,74	0,934	24/11/2025	23/01/2026	40	61
* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio	653,09	0,244	24/11/2025	23/01/2026	40	61
* * * * Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... fino a 6 cm (Percentuale del 20%) peperino (per ogni cm)	518,02	0,194	24/11/2025	23/01/2026	40	61
* * * * Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... DR 13,6 (PN 20): diametro esterno 140 mm, spessore 10,4 mm	475,22	0,178	24/11/2025	23/01/2026	40	61

COMUNE DI VITERBO
 PROTOCOLLO ARRIANO N. 410382/2025 del 17-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
**** Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25- dello spessore di 5,0 cm	38,89	0,015	24/11/2025	23/01/2026	40	61
**** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio	677,23	0,253	24/11/2025	23/01/2026	40	61
**** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... fino a 6 cm (Percentuale del 20%) peperino (per ogni cm)	134,29	0,050	24/11/2025	23/01/2026	40	61
** opere edili di finitura	23'265,46	8,704	12/11/2025	06/02/2026	58	87
*** restauro pavimentazioni e murature	23'265,46	8,704	12/11/2025	06/02/2026	58	87
**** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... cature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio	6'358,39	2,379	01/12/2025	06/02/2026	45	68
**** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... ino a 6 cm (Percentuale del 20%) travertino (per ogni cm)	6'680,24	2,499	01/12/2025	06/02/2026	45	68
**** Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseg ... mattoni industriali tipo "a mano" sabbiati (25x12x2,5 cm)	1'133,41	0,424	01/12/2025	06/02/2026	45	68
**** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino	2'401,48	0,898	01/12/2025	06/02/2026	45	68
**** Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... ino a 6 cm (Percentuale del 20%) travertino (per ogni cm)	1'911,06	0,715	01/12/2025	06/02/2026	45	68
**** PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale ... classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mmq	1'738,96	0,651	20/11/2025	24/12/2025	24	35
**** PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondaz ... Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mmq	662,12	0,248	20/11/2025	24/12/2025	24	35
**** Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	587,35	0,220	12/11/2025	16/12/2025	24	35
**** Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere	38,34	0,014	12/11/2025	16/12/2025	24	35
**** Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani ... mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto	670,48	0,251	20/11/2025	24/12/2025	24	35
**** Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, ... le ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata	63,96	0,024	20/11/2025	24/12/2025	24	35
**** Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	1'019,67	0,381	20/11/2025	24/12/2025	24	35
** accesso pedonale laterale	2'769,70	1,036	02/01/2026	17/03/2026	52	75
*** restauro pavimentazioni e murature	2'769,70	1,036	02/01/2026	17/03/2026	52	75
**** Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, e ... orra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	414,35	0,155	02/01/2026	17/03/2026	52	75
**** Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame	262,25	0,098	02/01/2026	17/03/2026	52	75
**** Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qua ... a scarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm.	255,92	0,096	02/01/2026	17/03/2026	52	75

COMUNE DI VITERBO
 Protocollo di Attivazione n. 110882/2025 del 17-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	251,85	0,094	02/01/2026	17/03/2026	52	75
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	258,59	0,097	02/01/2026	17/03/2026	52	75
* * * * PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondaz ... Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm ²	204,59	0,077	02/01/2026	17/03/2026	52	75
* * * * PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale ... classe di resistenza a compressione C 35/45 – Rck 45 N/mm ²	973,50	0,364	02/01/2026	17/03/2026	52	75
* * * * Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi ... i sfido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm	148,65	0,056	02/01/2026	17/03/2026	52	75
* overflow	67'269,80	25,167	23/09/2025	29/05/2026	172	449
** murature	50'636,76	18,944	20/10/2025	28/11/2025	30	9
*** restauro pavimentazioni e murature	40'922,24	15,310	20/10/2025	28/11/2025	30	4
* * * * Intonaco civile su murature con superfici che presentano ... Esclusi i ponteggi. con malta di calce idrata e pozzolana	35'210,00	13,173	20/10/2025	28/11/2025	30	7
* * * * Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco	2'858,41	1,069	20/10/2025	28/11/2025	30	4
* * * * Sovrapprezzo per l'esecuzione di intonaci su superfici orizzontali (Percentuale del 10% di 77,85)	212,51	0,080	20/10/2025	28/11/2025	30	3
* * * * Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq	2'641,32	0,988	20/10/2025	28/11/2025	30	4
*** sala porta faul	9'714,52	3,634	20/10/2025	28/11/2025	30	4
* * * * Consolidamento e stilatura di giunti: mediante rimozione ... azione della campionatura da parte della Direzione Lavori.	9'714,52	3,634	20/10/2025	28/11/2025	30	4
** opere edili di finitura	15'417,81	5,768	29/09/2025	29/05/2026	168	243
*** restauro pavimentazioni e murature	15'417,81	5,768	29/09/2025	29/05/2026	168	243
* * * * Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pietra squadrata regolare.	3'606,37	1,349	20/10/2025	28/11/2025	30	40
* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.	117,19	0,044	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	295,11	0,110	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	303,00	0,113	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès	365,04	0,137	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: ... e: non armato con ausilio di martello demolitore meccanico	164,40	0,062	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Demolizione e rimozione dei materiali di riempimento dei ... uto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.	1'241,14	0,464	29/09/2025	22/10/2025	18	24

COMUNE DI VITERBO

 Protocollo Arrevo N° 110382/2025 del 07-09-2025
 Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * * Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano	4'346,41	1,626	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.	841,81	0,315	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	2'010,43	0,752	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	2'064,18	0,772	29/09/2025	22/10/2025	18	24
* * * * Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)	62,73	0,023	12/11/2025	29/05/2026	136	199
** overflow	1'215,23	0,455	23/09/2025	15/10/2025	17	23
*** overflow	1'215,23	0,455	23/09/2025	15/10/2025	17	23
* * * * Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... vvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli	17,28	0,006	23/09/2025	03/10/2025	9	10
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	4,89	0,002	23/09/2025	03/10/2025	9	10
* * * * Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... rizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame	10,93	0,004	23/09/2025	03/10/2025	9	10
* * * * Ripresa di murature per integrazione di parti mancanti. R ... rre per dare l'opera finita. In pietra squadrata regolare.	79,26	0,030	23/09/2025	03/10/2025	9	10
* * * * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.	2,24	0,001	23/09/2025	03/10/2025	9	10
* * * * Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... o i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4	2,63	0,001	23/09/2025	03/10/2025	9	10
* * * * Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo ... ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm	403,25	0,151	29/09/2025	06/10/2025	6	8
* * * * Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di ... , forniture accessorie ed ogni onere e magistero: castagno	302,66	0,113	29/09/2025	06/10/2025	6	8
* * * * Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ... mm più scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/mq	110,35	0,041	06/10/2025	15/10/2025	8	10
* * * * Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B	187,95	0,070	29/09/2025	06/10/2025	6	8
* * * * Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147	48,67	0,018	29/09/2025	06/10/2025	6	8
* * * * Pavimentazione in gomma sintetica al 100% con superficie ... in teli alti 1,00-2,00 m e dello spessore di 2,5 mm circa	45,12	0,017	29/09/2025	06/10/2025	6	8
Data, 15/09/2025						
Tecnico arch. Sergio Ferrante						

COMUNE DI VITERBO

POT-COLLE Art. 110-382/2025 del 15-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

Comune di Viterbo

Provincia di Viterbo

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Restauro e consolidamento della Porta Faul e adattamento a check point turistico della c.d. casa di Alfio

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

, 15/09/2025

Il Tecnico
(arch. Sergio Ferrante)


COMUNE DI VITERBO
Protocollo Arrivo N. 110382/2025 del 17-09-2025
Allegato 6 - Class. 14.1 - Copia Documento

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
15/09/2025	555,22	555,22	0,208
16/09/2025	555,22	1'110,44	0,415
17/09/2025	555,22	1'665,66	0,623
18/09/2025	555,22	2'220,88	0,831
19/09/2025	555,22	2'776,11	1,039
22/09/2025	698,21	3'474,31	1,300
23/09/2025	711,23	4'185,55	1,566
24/09/2025	711,23	4'896,78	1,832
25/09/2025	789,21	5'685,99	2,127
26/09/2025	789,21	6'475,20	2,423
29/09/2025	2'000,93	8'476,14	3,171
30/09/2025	2'000,93	10'477,07	3,920
01/10/2025	4'421,45	14'898,52	5,574
02/10/2025	4'421,45	19'319,96	7,228
03/10/2025	4'431,01	23'750,98	8,886
06/10/2025	6'226,12	29'977,10	11,215
07/10/2025	6'061,52	36'038,63	13,783
08/10/2025	6'061,52	42'100,15	15,759
09/10/2025	6'132,23	48'232,38	18,049
10/10/2025	6'132,24	54'364,62	20,333
13/10/2025	5'951,91	60'316,52	22,560
14/10/2025	5'977,41	66'293,93	24,802
15/10/2025	5'806,72	72'100,66	26,975
16/10/2025	5'792,93	77'893,59	29,142
17/10/2025	5'792,94	83'686,53	31,300
20/10/2025	7'685,86	91'372,38	34,185
21/10/2025	6'956,63	98'329,01	36,787
22/10/2025	6'956,63	105'285,65	39,190
23/10/2025	6'303,92	111'589,57	41,749
24/10/2025	6'303,92	117'893,49	44,103
27/10/2025	5'171,71	123'065,20	46,049
28/10/2025	4'917,47	127'982,67	47,681
29/10/2025	4'814,45	132'797,12	49,388
30/10/2025	4'814,44	137'611,56	51,182
31/10/2025	3'086,38	140'697,93	52,638
03/11/2025	3'207,04	143'904,97	53,838
04/11/2025	3'207,04	147'112,01	55,038
05/11/2025	3'207,04	150'319,06	56,239
06/11/2025	3'207,04	153'526,10	57,439
07/11/2025	3'207,05	156'733,14	58,639
10/11/2025	3'568,38	160'301,53	59,973
11/11/2025	3'483,37	163'784,90	61,270
12/11/2025	3'509,91	167'294,81	62,589
13/11/2025	3'509,91	170'804,71	63,902
14/11/2025	3'509,91	174'314,62	65,215
17/11/2025	2'953,28	177'267,90	66,320
18/11/2025	2'953,28	180'221,18	67,425
19/11/2025	2'953,28	183'174,46	68,530
20/11/2025	3'126,41	186'300,87	69,700
21/11/2025	3'126,41	189'427,29	70,869
24/11/2025	4'073,88	193'501,17	72,393
25/11/2025	4'073,88	197'575,05	73,917
26/11/2025	4'073,88	201'648,94	75,442
27/11/2025	4'073,88	205'722,82	76,966
28/11/2025	4'073,87	209'796,69	78,490
01/12/2025	1'200,81	210'997,50	78,939
02/12/2025	1'200,81	212'198,30	79,388
03/12/2025	1'200,81	213'399,11	79,838
04/12/2025	1'200,81	214'599,91	80,287
05/12/2025	1'200,81	215'800,72	80,736
09/12/2025	1'200,81	217'001,53	81,185
10/12/2025	1'200,81	218'202,33	81,635
11/12/2025	1'200,81	219'403,14	82,084

COMUNE DI VITERBO

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/12/2025	1'200,81	220'603,94	82,533
15/12/2025	1'200,81	221'804,75	82,982
16/12/2025	1'200,81	223'005,56	83,432
17/12/2025	1'174,74	224'180,29	83,871
18/12/2025	1'174,74	225'355,03	84,311
19/12/2025	1'174,74	226'529,77	84,750
22/12/2025	1'174,74	227'704,50	85,190
23/12/2025	1'174,74	228'879,24	85,629
24/12/2025	1'174,75	230'053,99	86,069
29/12/2025	777,29	230'831,27	86,359
30/12/2025	777,29	231'608,56	86,650
31/12/2025	777,12	232'385,68	86,941
02/01/2026	796,32	233'181,99	87,239
05/01/2026	796,32	233'978,32	87,537
07/01/2026	794,92	234'773,24	87,834
08/01/2026	794,92	235'568,16	88,132
09/01/2026	775,64	236'343,80	88,429
12/01/2026	775,64	237'119,44	88,726
13/01/2026	775,64	237'895,08	89,023
14/01/2026	775,64	238'670,73	89,320
15/01/2026	775,64	239'446,37	89,617
16/01/2026	775,64	240'222,01	89,914
19/01/2026	775,64	240'997,65	90,211
20/01/2026	775,64	241'773,29	90,508
21/01/2026	775,64	242'548,93	90,805
22/01/2026	775,64	243'324,57	91,102
23/01/2026	775,64	244'100,21	91,399
26/01/2026	713,22	244'813,43	91,696
27/01/2026	713,22	245'526,66	91,993
28/01/2026	713,22	246'239,88	92,290
29/01/2026	713,22	246'953,10	92,587
30/01/2026	712,48	247'665,58	92,884
02/02/2026	655,21	248'320,79	93,181
03/02/2026	655,21	248'975,99	93,478
04/02/2026	655,21	249'631,20	93,775
05/02/2026	655,21	250'286,41	94,072
06/02/2026	655,22	250'941,62	94,369
09/02/2026	244,44	251'186,06	94,666
10/02/2026	244,44	251'430,50	94,963
11/02/2026	244,44	251'674,94	95,260
12/02/2026	244,44	251'919,38	95,557
13/02/2026	244,44	252'163,82	95,854
16/02/2026	244,44	252'408,26	96,151
17/02/2026	244,44	252'652,69	96,448
18/02/2026	244,44	252'897,13	96,745
19/02/2026	244,44	253'141,57	97,042
20/02/2026	244,44	253'386,01	97,339
23/02/2026	244,44	253'630,45	97,636
24/02/2026	244,44	253'874,89	97,933
25/02/2026	244,44	254'119,32	98,230
26/02/2026	244,44	254'363,76	98,527
27/02/2026	244,44	254'608,20	98,824
02/03/2026	244,44	254'852,64	99,121
03/03/2026	244,44	255'097,08	99,418
04/03/2026	244,44	255'341,52	99,715
05/03/2026	244,44	255'585,95	100,012
06/03/2026	244,44	255'830,39	100,309
09/03/2026	244,44	256'074,83	100,606
10/03/2026	244,44	256'319,27	100,903
11/03/2026	244,44	256'563,71	101,200
12/03/2026	244,44	256'808,15	101,497
13/03/2026	244,44	257'052,59	101,794
16/03/2026	244,44	257'297,02	102,091

COMUNE DI VITERBO

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
17/03/2026	244,43	257'541,45	96,352
18/03/2026	191,18	257'732,62	96,424
19/03/2026	191,18	257'923,80	96,495
20/03/2026	191,18	258'114,97	96,567
23/03/2026	191,18	258'306,15	96,638
24/03/2026	191,18	258'497,32	96,710
25/03/2026	191,18	258'688,50	96,781
26/03/2026	191,18	258'879,67	96,853
27/03/2026	191,18	259'070,85	96,925
30/03/2026	191,18	259'262,03	96,996
31/03/2026	191,18	259'453,20	97,068
01/04/2026	191,18	259'644,38	97,139
02/04/2026	191,18	259'835,55	97,211
03/04/2026	191,18	260'026,73	97,282
07/04/2026	191,18	260'217,90	97,354
08/04/2026	191,18	260'409,08	97,425
09/04/2026	191,18	260'600,25	97,497
10/04/2026	191,18	260'791,43	97,568
13/04/2026	191,18	260'982,60	97,640
14/04/2026	191,18	261'173,78	97,711
15/04/2026	191,18	261'364,95	97,783
16/04/2026	191,18	261'556,13	97,854
17/04/2026	191,18	261'747,30	97,926
20/04/2026	191,18	261'938,48	97,997
21/04/2026	191,18	262'129,65	98,068
22/04/2026	191,18	262'320,83	98,140
23/04/2026	191,18	262'512,00	98,212
24/04/2026	191,18	262'703,18	98,283
27/04/2026	191,18	262'894,35	98,355
28/04/2026	191,18	263'085,53	98,426
29/04/2026	191,18	263'276,70	98,498
30/04/2026	191,18	263'467,88	98,569
04/05/2026	191,18	263'659,05	98,641
05/05/2026	191,18	263'850,23	98,712
06/05/2026	191,18	264'041,40	98,784
07/05/2026	191,18	264'232,58	98,855
08/05/2026	191,18	264'423,75	98,927
11/05/2026	191,18	264'614,93	98,998
12/05/2026	191,18	264'806,10	99,070
13/05/2026	191,18	264'997,28	99,141
14/05/2026	191,18	265'188,45	99,213
15/05/2026	191,18	265'379,63	99,284
18/05/2026	191,18	265'570,80	99,356
19/05/2026	191,18	265'761,98	99,428
20/05/2026	191,18	265'953,15	99,499
21/05/2026	191,18	266'144,33	99,571
22/05/2026	191,18	266'335,50	99,642
25/05/2026	191,18	266'526,68	99,714
26/05/2026	191,18	266'717,85	99,785
27/05/2026	191,18	266'909,03	99,857
28/05/2026	191,18	267'100,20	99,928
29/05/2026	191,17	267'291,37	100,000
Data, 15/09/2025			
Tecnico arch. Sergio Ferrante  			

COMUNE DI VITERBO
